



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

emp
Empitalito



28 septiembre de 1989. Acuerdo 034 de 1989



ACUEDUCTO



ASEO



ALCANTARILLADO



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

emp
Empitalito



PROPOSICION 034 Concejo Municipal de Pitalito Huila

18 de agosto de 2026



1

Cuáles son los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo con sus metas y proyectos desarrollados por EMPITALITO desde el año 2024 a la fecha.



PLAN DE DESARROLLO

El Gobierno de la Gente, Pitalito 2024–2027

Código del producto	Producto	Código del indicador de producto	Indicador de producto	Clasificación de la meta	Unidad de medida	Meta cuatrienio	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026 junio	%
4003009	Servicio de Acueducto	400300900	Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto	No acumulada	Número	37.000	33.317	34.526	35170	95
4003014	Servicio de Alcantarillado	400301400	Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado	No acumulada	Número	36.000	31.770	33.046	33736	93
4003017	Acueductos optimizados	400301703	Red de distribución optimizada	No acumulada	Metros lineales	1.000	324	500	600	142
4003018	Alcantarillados construidos	400301802	*Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas	No acumulada	Número	1				0
4003018	Alcantarillados construidos	400301803	Red de alcantarillado construida	No acumulada	Metros lineales	3.680	656	1.330	582	69
4003020	Alcantarillados optimizados	400302003	Red de alcantarillado optimizada	No acumulada	Metros lineales	7.000	1820	2.600	2.860	133
4003023	Servicios de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS	400302300	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con seguimiento	Acumulado	Número	2	2	2	2	75
4003025	Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado	400302500	Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados	No acumulada	Número	3		1	2	100
4003047	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios	400304700	Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	Acumulado	Número	33.640	27792	28557	29919	88

Ejecución
del
Cuatrienio

88%



PROYECTOS ESTRATÉGICOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO

Reposición y/o construcción de colectores del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Pitalito, Huila



ML

\$

TERMINADO

100%

880

2500,039

1.999.819.413



REPOSICION Y/O CONSTRUCCION DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA


No.	DIRECCION	6"	10"	16"	TOTAL ML	USUARIOS BENEFICIADO S
1	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 2A ENTRE 18 Y 19 BARRIO SIMON BOLIVAR	68,08		88,89	156,97	60
2	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 25C ENTRE CRA. 5 Y 5B. BARRIO LARA BONILLA	40,81	89,80		130,61	45
TOTAL		108,89	89,80	88,89	287,58	105

\$295.708.836

COMUNA 1



SIMON
BOLIVAR

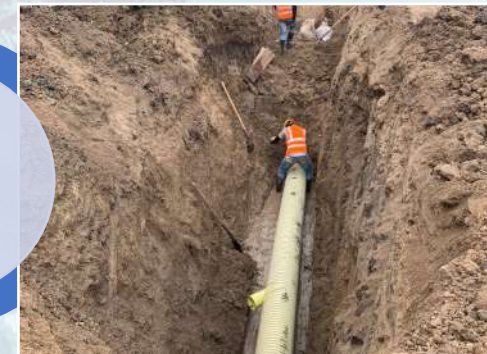

SIMON
BOLIVAR



**REPOSICION Y/O CONSTRUCCION DE COLECTORES
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA**

No.	DIRECCION	6"	8"	10"	14"	24"	TOTAL ML	USUARIOS BENEFICIADOS
1	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 3 SUR ENTRE CARRERA 9 Y 11 ESTE. BARRIO PRADERA	90,96		214,60			305,56	95
2	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 9 ESTE ENTRE CALLE 3 SUR Y 3B BARRIO PRADERA	40,10	52,55				92,65	30
3	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 9 ESTE ENTRE CALLE 3D SUR Y 3B BARRIO PRADERA	83,26	85,30				168,56	50
4	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 15 ENTRE CARRERA. 1B Y 1A BARRIO SAN RAFAEL	13,80				55,70	69,50	15
5	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 15 ENTRE CARRERA. 1 Y 1A BARRIO SAN RAFAEL	30,70	14,70			76,50	121,90	30
6	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 9 ESTE ENTRE DIAGONAL 3 Y 4A SUR. BARRIO BOSQUES DE LA RIVIERA	72,00	101				159,20	60
7	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERA 12 Y 13 ESTE. BARRIO PARAISO				80,00		80,00	ESTUDIANTES FUTUROS COLEGIO WINNIPEG
TOTAL		330,82	253,55	214,60	80,00	132,20	980,52	280,00

\$ 657.834.800

COMUNA 2



PRADERA



SAN
RAFAEL



COMUNA 3

REPOSICION Y/O CONSTRUCCION DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

No.	DIRECCION	6"	8"	10"	24"	TOTAL ML	USUARIOS BENEFICIADOS
1	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 BARRIO TRINIDAD	68,71		18,10	65,50	152,31	25
2	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 2 BARRIO TRINIDAD	87,71		77,80		165,51	60
3	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 2 Y 1 BARRIO TRINIDAD	48,30	110,40			158,70	30
TOTAL		204,72	110,40	95,90	65,50	476,52	115,00

\$ 452.034.430



TRINIDAD



TRINIDAD



REPOSICION Y/O CONSTRUCCION DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

COMUNA 4

No.	DIRECCION	6"	8"	10"	12"	TOTAL ML	USUARIOS BENEFICIADOS
1	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 22A ENTRE CARRERA 3 Y 2 SUR BARRIO MADELENA	123,67	109,40			233,07	95
2	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 6 SUR ENTRE CALLES 19A SUR Y 19B SUR. BARRIO SIGLO XXI	13,50			42,25	55,75	15
3	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 19B SUR ENTRE CARRERA 6 SUR Y AV. CIRCUNVALAR. BARRIO SIGLO XXI	30,55		109,00		139,55	105
4	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 19B SUR Y 21 SUR. BARRIO SIGLO XXI	102,73			104,00	242,80	115
5	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 15 SUR Y 17 SUR. BARRIO VILLA CAFÉ	42,77	77,90			131,90	50
TOTAL		313,22	187,30	109,00	146,25	755,77	380

\$ 594.232.630



VILLA
CAFÉ



SIGLO XXI



CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO



COMUNA4

RECURSOS SUMINISTRO – HUMANO			
No.	DIRECCION	TOTAL, ML	USUARIOS BENEFICIADOS
1	CONSTRUCCION DE COLECTOR ALCANTARILLADO SECTOR AMERICAS EN LA TRANSVERSAL 22 ENTRE CALLE 6B Y 8	183,20	4110
2	CONSTRUCCION DE COLECTOR ALCANTARILLADO QUINTO DISTRITO ESTACION DE POLICIA - SECTOR LA VIRGINIA	135,00	1910
TOTAL		318,20	6020,00



COMUNA
1

\$ 269.614.2112



PROYECTOS ESTRATÉGICOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO

Construcción y adecuación de planta de tratamiento de aguas Residuales (programa de gobierno - Construcción de PTAR aguas arriba y abajo del río Guarapas)

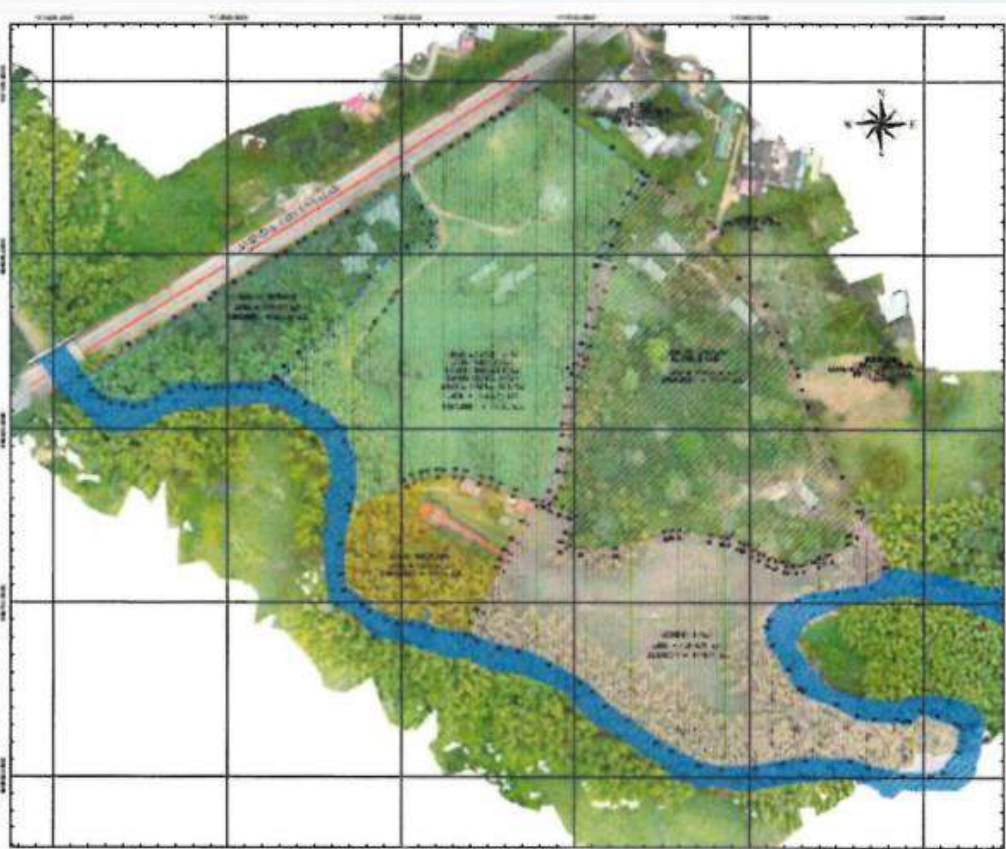


Ilustración 1. Localización Predio PTAR Pitalito



Imagen 2. Caracterización de agua cruda Rio Guarapas



Imagen 3. Caracterización vertimiento PTAR Pitalito

CONVENIO

Municipio de
Pitalito -
EMPITALITO

ESTUDIOS Y
DISEÑOS

\$976.610.179


ESTADO

Ejecución



PROYECTOS ESTRATÉGICOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO

Instalación de polivalvulas para la sectorización del sistema de acueducto del municipio de Pitalito (sectorización)

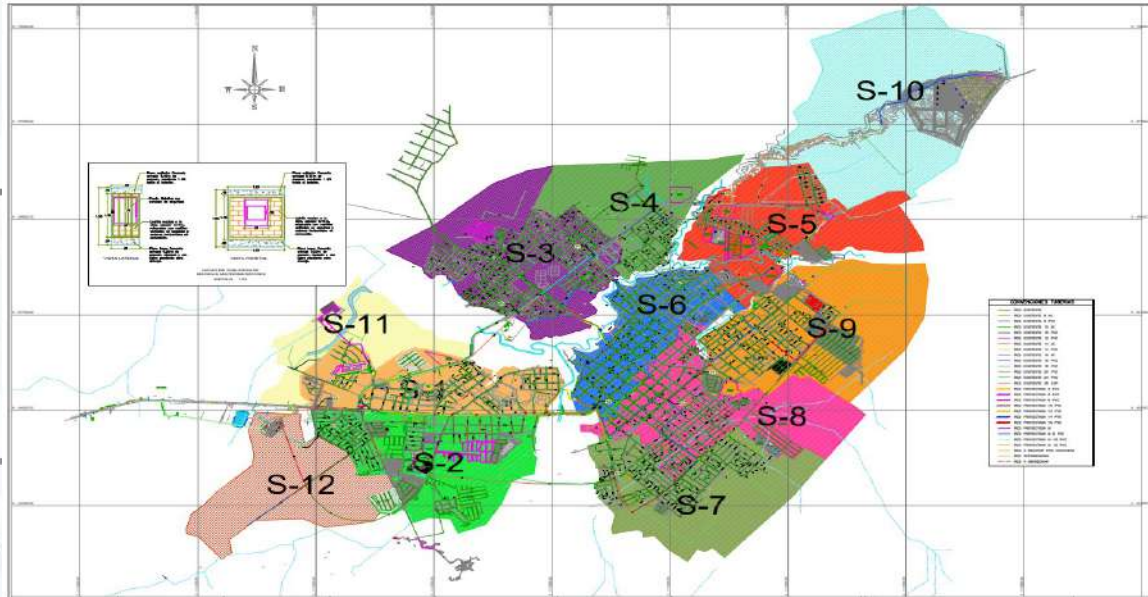

CONVENIO

Municipio de
Pitalito -
EMPITALITO

VALOR DEL
PROYECTO

\$8,245,940,658

ESTADO

Pendientes de
financiación

Construcción alcantarillado aguas lluvias aldea la Libertad

GESTION

-VICEMINISTERIO -
CORMAGDALENA

VALOR DEL
PROYECTO

\$
17.302.201.967

ESTADO

Pendientes de
financiación






PROYECTOS ESTRATÉGICOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO

Estudios y diseños para construcción del Reservorio Municipal

Figura 14. Predio de EMPITALITO ESP para reservorio

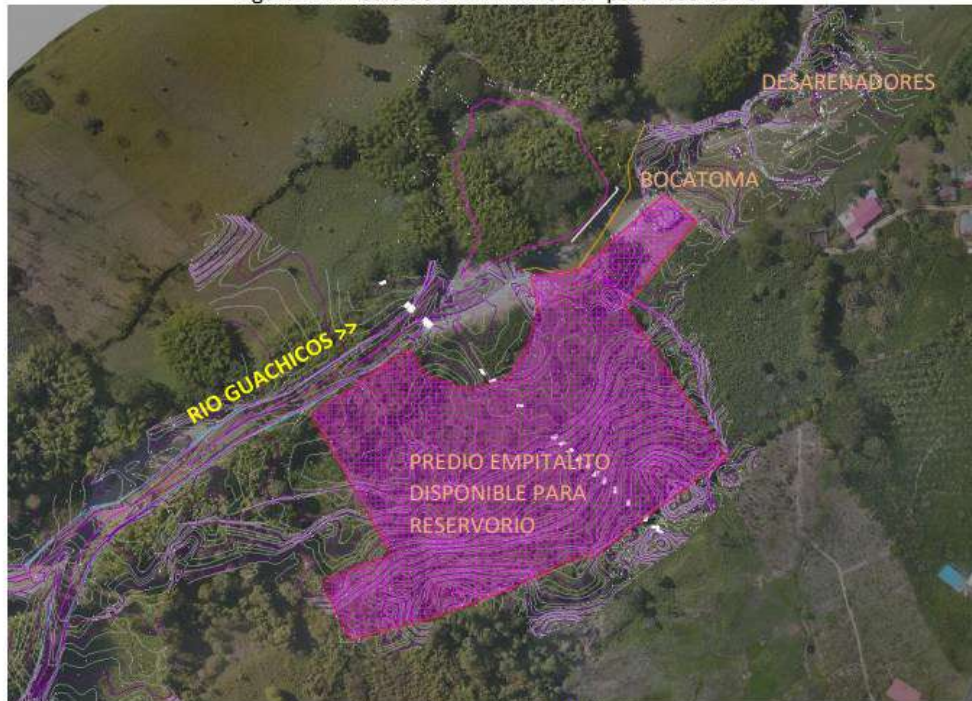

Fuente: el Consutor.

\$ 56.361.056.654,00

TERMINADO

100%



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

emp
Empitalito

INVERSION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO





Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

emp
Empitalito



SISTEMA DE ACUEDUCTO



Sistema Acueducto - 2024

Item	Proyecto	Valor \$	Estado	Observación
1	Optimización de red de acueducto en el municipio de Pitalito sector la virginia, siglo XXI y villa café	48.757.655	Terminado	obra por administración directa
2	Optimización de red de acueducto en el municipio de Pitalito sector la isla	6.320.437	Terminado	





Sistema Acueducto - 2025

Item	Proyecto	Valor \$	Estado	Observación
1	Estudios y diseños de la sectorización del sistema de acueducto del municipio de Pitalito huila	114.986.130	Terminado	Cofinanciados por la Alcaldía + EPP
2	Estudios y diseños de la construcción del reservorio del sistema de acueducto del municipio de Pitalito	229.660.480	Terminado	Cofinanciados por la Alcaldía + EPP
3	Construcción, ampliación y optimización del sistema de acueducto para los sectores sucre norte y Tequendama del municipio de Pitalito – huila	275.185.399	Terminado	Recursos propios
			Terminado	Recursos propios
4	Optimización, construcción y mantenimiento de áreas locativas e infraestructuras hidráulicas en la planta de tratamiento de agua potable guatipán, bocatoma y puntos de muestreo del sistema de acueducto del municipio de Pitalito	433.933.177	Terminado	Recursos propios
5	Construcción de viaducto red de distribución 4" sector valle verde municipio de Pitalito	6.724.037	Terminado	obra por administración directa
6	Ampliación de la red de acueducto para bajo solarte, el maco del municipio de Pitalito-	7.299.982	Terminado	obra por administración directa
7	Reparación de red conducción 12" sector puente la burrera del municipio de Pitalito - huila.	19.306.400	Terminado	obra por administración directa
8	Ampliación red de acueducto barrio el triángulo, vía acevedo del municipio de Pitalito - huila.	6.301.714	Terminado	obra por administración directa
9	Implementación procedimientos según la normatividad laboratorio de agua	187.028.610	Terminado	Recursos propios
Total		1.280.425.929		



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

emp
Empitalito

Sistema Acueducto - 2025





Sistema Acueducto - 2026

ACUEDUCTO				
Item	Proyecto	Valor \$	Estado	Observación
1	Reparación red de distribución y enmalle de tubería de 6" a 3" sobre la calle 18 con carrera 9e. Villas de san Carlos	\$19,631,734	Terminado	obra por administración directa
2	Reparación red de distribución y enmalle de tubería de 3" sobre la calle 22 con carrera 4e y 5e, san miguel	\$7,660,534	Terminado	obra por administración directa
3	Construcción de red de distribución de acueducto sector gaviotas	\$80.000.000	Terminado	obra por administración directa
4	Construcción, optimización y reposición de redes y componentes hidráulicos de los sistemas de acueducto del municipio de Pitalito, huila	\$660.202.047	Ejecución	Recursos propios
TOTAL		\$767.494.315		





Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

emp
Empitalito

Sistema Acueducto - 2026





Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

emp
Empitalito

Sistema Acueducto

Arreglos red de conducción





Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

emp
Empitalito

Bocatoma





Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

emp
Empitalito

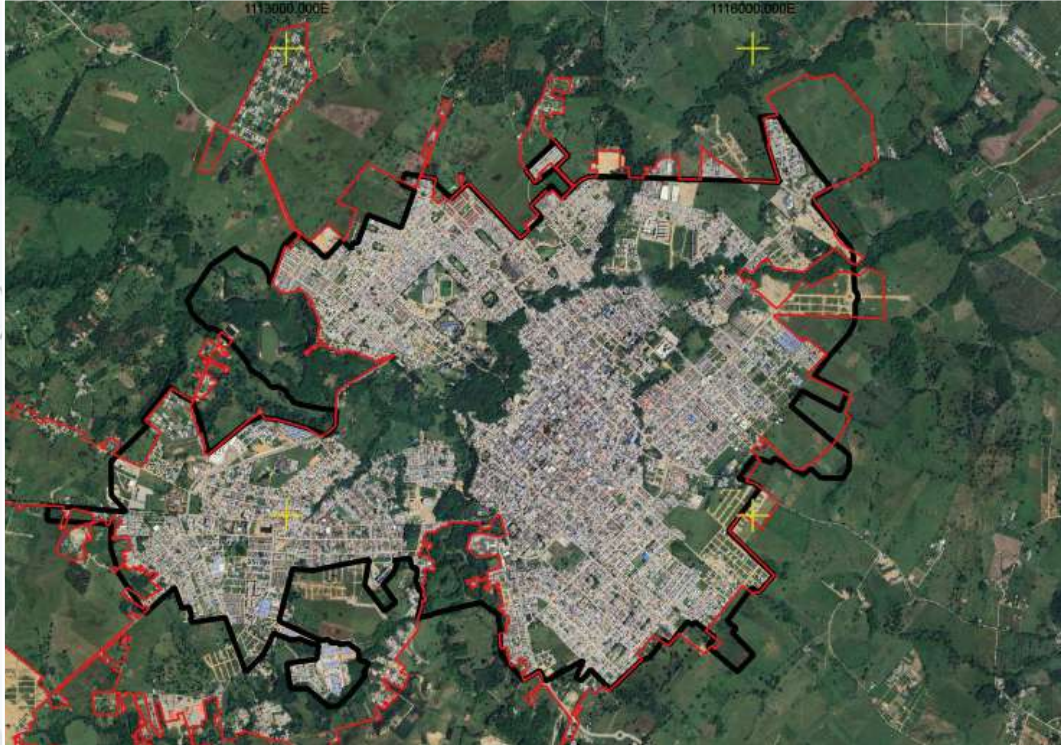


Ilustración Área de Servicio Empitalito

SISTEMA DE ALCANTARILLA DO SANITARIO



SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2024

Item	Proyecto	Valor \$	Estado	Observación
1	Prefactibilidad de estudios y diseños para la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales y/o PTAR del municipio de Pitalito Huila	79.993.020	Terminado	Recursos propios
1	Reposición y/o construcción de colectores del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Pitalito Huila	1.999.829.573	Terminado	Recursos propios
2	Mantenimiento preventivo al zanjón del burro, zanjón de los tiestos, planta de tratamiento de aguas residuales, reposición muro del zanjón del burro y limpieza de sumideros.	207.813.808	Terminado	Recursos propios
3	Reposición y optimización de redes de alcantarillado sanitario en vías de interés prioritario del municipio de Pitalito huila.	978.524.406	Terminado	Cofinanciados por la Alcaldía + EPP
4	Construcción colector alcantarillado sector Américas en la transversal 22	127.889.417	Terminado	obra por administración directa
5	Construcción colector alcantarillado quinto distrito - estación de policía - virginia	141.724.795	Terminado	
	Total	3.535.775.019		



SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ZANJON DEL BURRO, ZANJON DE LOS TIESTOS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, REPOSICION MURO DEL ZANJON DEL BURRO Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1	LIMPIEZA DE SUMIDEROS COMUNA 1	UND	424,00
2	LIMPIEZA DE SUMIDEROS COMUNA 2	UND	555,00
3	LIMPIEZA DE SUMIDEROS COMUNA 3	UND	563,00
4	LIMPIEZA DE SUMIDEROS COMUNA 4	UND	318,00
5	LIMPIEZA ZANJON DE LOS TIESTOS	ML	1870,00
6	LIMPIEZA ZANJON DE LOS TIESTOS	ML	825,00
7	CONSTRUCCION MURO ZANJON DEL BURRO	ML	17,00
8	MANTENIENDO Y LIMPIEZA EN LA PTAR	GBL	1,00





SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2025

Item	Proyecto	Valor \$	Estado	Observación
1	Construcción de sistemas sépticos para la descontaminación de la microcuenca de la quebrada el cedro, cuenca del rio Guachicos, corregimiento de Bruselas	1.291.152.644	Terminado	Cofinanciados por la Alcaldía + EPP
2	Mantenimiento preventivo al zanjón del burro, zanjón de los tiestos, planta de tratamiento de aguas residuales y limpieza de sumideros del municipio de Pitalito	198.990.657	Terminado	Recursos propios
3	Estudios y diseños para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (ptar) en el municipio de Pitalito huila	1.123.101.706	Ejecución	Cofinanciados por la Alcaldía + EPP
4	Estudios y diseños de la construcción del alcantarillado sanitario y pluvial sector villas de san roque y alcantarillado sanitario sector los guaduales municipio de Pitalito huila	228.972.065	Ejecución	Cofinanciados por la Alcaldía + EPP
5	Construcción, reposición y optimización de redes del sistema de alcantarillado en el municipio de Pitalito (las cuatro comunas)	2.774.558.505	Terminado	Cofinanciados por la Alcaldía + EPP
6	Construcción de viaducto sector barrio libertador del municipio de Pitalito departamento del huila	452.002.625	Ejecución	Recursos propios
7	Construcción, reposición y optimización de redes del sistema de alcantarillado pluvial y del colector de alcantarillado sanitario y obras conexas en el municipio de Pitalito (avenida del estudiante)	1.772.441.848	Terminado	Cofinanciados por la Alcaldía + EPP
8	Estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del sector la cabaña, sistema de alcantarillado pluvial del sector emaya – bosques de las orquídeas y lechos de secado de lodos en la planta de tratamiento de agua potable (ptap)	80.000.000	Terminado	Recursos propios
9	Alcantarillado en sectores priorizados en el municipio de Pitalito huila – Villas del tesoro y la av. Carrera 15	49.067.629	Terminado	Recursos propios
	TOTAL	\$7.970.287.679		



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

emp
Empitalito

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2025



Aldea la Libertad



San Miguel



San Mateo



CALLE 25C ENTRE CARRERAS 11 Y 11B BARRIO LARA BONILLA





SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2026

Item	Proyecto	Valor \$	Estado	Observación
1	Construcción, optimización y reposición de redes y componentes hidráulicos de los sistemas de alcantarillado del municipio de Pitalito, huila	1.500.429.073	Ejecución	Recursos propios
2	Construcción, optimización y reposición de redes de acueducto, alcantarillado y obras conexas en la transversal 3ra sur del municipio de Pitalito huila. Reposición av. Paisajistas	4.823.763.350	En proceso de contratación	Cofinanciados por la Alcaldía + EPP
3	Construcción alcantarillado pluvial calle 6 entre carrera 8b este y 11 esta construcción alcantarillado pluvial. Villa del tesoro	144.998.361	Terminado	obra por administración directa
4	Construcción alcantarillado carrera 15 entre calle 7 y 10 barrio cálamó costado sur-norte. Cálamó	76.768.180	Terminado	obra por administración directa
5	Construcción aliviadero pluvial. Carrera 3a este con calle 21. Laureles	12.428.462	Terminado	obra por administración directa
6	Reposición, Reparación alcantarillado sanitario las acacias, los andes, porvenir, 7 de agosto, Lomitas, Aldea la libertad	84.629.171	Terminado	obra por administración directa
	Total	6.643.016.597		

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2026



CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTO SECTOR BARRIO
LIBERTA DEL MUNICIPIO DE PITALITO



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL DE SUMIDEROS DE AGUAS
LLUVIAS, ZANJÓN DE LOS TIESTOS, ZANJÓN DEL BURRO, ZANJÓN DE LA
ISLA Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO



MANTENIMIENTO LIMPIEZA ZONA DE CAPTACION



REPARACION RED DE CONDUCCION

emp
Empitalito



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

ATENCIÓN APQR

tepp
Empitalito



FUGA -TRINIDAD



FUGA CRISTO REY



FUGA NORMANDÍA



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

ATENCIÓN APQR

emp
Empitalito



FUGA –AGUA BLANCA



DAÑO TUBERÍA DE GRESS – LAS VILLAS



FUGA PORTOBELO



2

Teniendo en cuenta que la Fase II del Plan Maestro de Acueducto constituye una infraestructura estratégica para garantizar la capacidad futura del sistema, sírvase informar si la capacidad hidráulica actual del acueducto del casco urbano permite atender la demanda presente y futura del municipio. En caso contrario, indique las limitaciones existentes y las consecuencias que tendría para el desarrollo urbano de Pitalito la no ejecución de esta fase.

CAPACIDAD DEL SISTEMA Y NECESIDAD DE LA FASE II

● ACTUAL	● 3-4 AÑOS	● 2044
Capacidad suficiente Demanda actual cubierta	Consolidación expansión Consolidación de expansión	210.284 habitantes 668,92 L/s Conducción 24

ACTUAL —————► CRECIMIENTO —————► FASE II

Cobertura Continuidad Presión	537 hectarea de expansión Urbana	Garantiza Capacidad futura
--	---	-----------------------------------

FASE II: infraestructura estratégica para garantizar el crecimiento ordenado y sostenible de Pitalito.



ZONA DE CAPTACIÓN



CONSECIÓN:

668 L/S
RIO GUACHICOS

CAPTADO:

300 L/S



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

DESARENADORES

emp
Empitalito



www.empitalito.gov.co



alcaldiapitalito.gov.co



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

RED DE CONDUCCIÓN

10"

12"

16"


www.empitalito.gov.co





Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

tepp
Empitalito

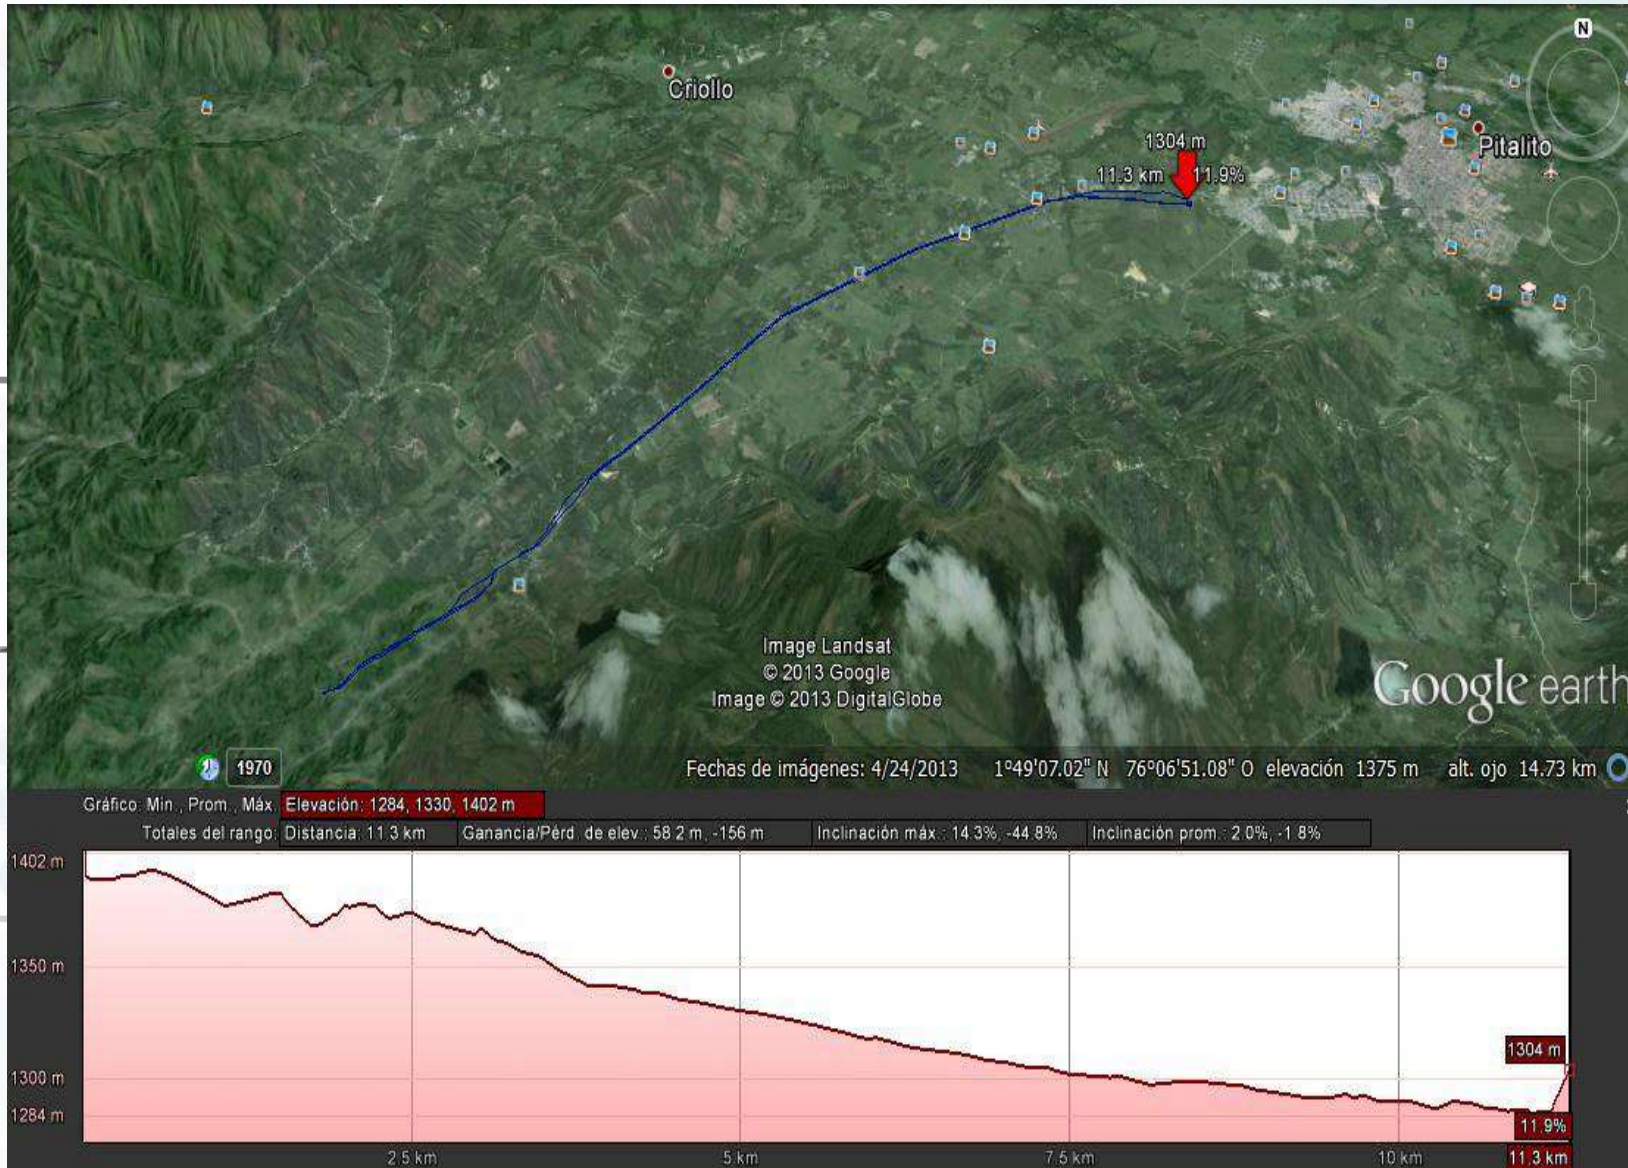

RED DE CONDUCCIÓN

11.3 Km



PLAN MAESTRO FASE II

VALOR CONTRATO

✓ VALOR INICIAL	\$15.356.858.116
✓ ADICIÓN No.1	\$ 1.385.999.785
✓ ADICIÓN No.2	\$ 3.831.628.869
✓ VALOR	\$20.574.486.770
✓ ESTADO	TERMINADO
✓ AVANCE FISICO	52%
✓ ACANCE FINANCIERO	37%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

✓ Caudal	500 L/S
✓ Línea de aducción: Tubería PVC RDE 21 Diámetro 18"	54,5 ml
✓ Desarenador	188 l/s
✓ Línea de Conducción:	11.337 ml
✓ Viaducto	23 ml





PLAN MAESTRO FASE II



INFORMACIÓN CONTRACTUAL

- ✓ **Contrato de obra:**
- ✓ No. PAF-ATF-O-045-2019
- ✓ UNION TEMPORAL G.A.D PITALITO
- ✓ Acta Inicio: Enero 30 de 2020

- ✓ **V. FINANCIERO: \$7.793.067.858**
- ✓ **VALOR FISICO: \$ 10.698.733.120**
- ✓ **V. POR EJECUTAR: \$ 9.875.753.650**

- ✓ **Contrato de Interventoría:**
- ✓ No. PAF-ATF-O-039-2019
- ✓ CONSORCIO INTER HUILA 2019
- ✓ Valor de \$821.478.196
- ✓ Acta Inicio: Enero 30 de 2020





Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

emp
Empitalito

PLANTA DE TRATAMIENTO



ENTRADA:
260 L/S



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

TRENES DE TRATAMIENTO



U.P: 10
L/S

1:180
L/S

2:150
L/S

3:200
L/S

540
L/S



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

ALMACENAMIENTO

tepp
Empitalito



14.000 m3



alcaldiapitalito.gov.co



3

3. Sírvese informar cuántas disponibilidades de servicios de acueducto y alcantarillado han sido expedidas durante los años 2023, 2024, 2025 y 2026, discriminadas por año. Así mismo, indique si alguna solicitud ha sido negada, condicionada o aplazada por insuficiencia de capacidad del sistema de acueducto o alcantarillado.



Año	Solicitudes recibidas			Disponibilidades otorgadas		
	Proyectos	Viviendas	Total	Proyectos	Viviendas	Total
2023	57	54	111	35	37	72
2024	37	52	89	20	26	46
2025	35	73	108	18	53	71
2026*	19	94	113	10	86	96
Total	148	273	421	83	202	285



4

4. Sírvese informar el estado de ejecución del contrato de prestación de servicios jurídicos suscrito para asesorar el proceso relacionado con la antigua sede administrativa de EMPITALITO E.S.P., indicando el porcentaje de ejecución, las actividades desarrolladas a la fecha, los productos entregados por el contratista y el cronograma pendiente por ejecutar.



CONTRATO 032 DE 2026 – ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA

 CONTRATISTA	 INICIO	 AVANCE	 ALTERNATIVAS
RICCI ABOGADOS S.A.S.	30 enero 2026	64%	8 identificadas
Asesoría jurídica especializada	Corte: mayo 2026	En ejecución	En análisis y valoración

¿Qué comprende el contrato?

ANÁLISIS → CONCEPTOS → VALORACIÓN
NORMATIVO JURÍDICOS DE OPCIONES



5

¿A la fecha existe alguna decisión administrativa adoptada por la Junta Directiva o la Gerencia de EMPITALITO E.S.P. respecto de la enajenación, permuta, adquisición o cambio de destinación de la antigua sede administrativa?

ESTADO ACTUAL – ANTIGUA SEDE ADMINISTRATIVA

⚠ **NO EXISTE DECISIÓN DEFINITIVA A LA FECHA**

(No se ha aprobado la venta, enajenación, permuta, adquisición ni cambio de destinación del inmueble)

ACUERDO No. 05
Directiva

Junta

AUTORIZACIÓN PARA
EVALUAR Y ESTRUCTURAR
ALTERNATIVAS

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN |

- Jurídica
- Técnica
- Financiera
- Administrativa

ACTUALMENTE EN
EVALUACIÓN

● **LO QUE SÍ HIZO**

- Autorizó evaluar alternativas
- Permitió adelantar estudios
- Permitió estructurar opciones
- Facultó la gestión administrativa y jurídica

● **LO QUE NO HIZO**

- No autorizó la venta
- No autorizó la permuta
- No aprobó la compra de otro inmueble
- No cambió la destinación del inmueble
- No perfeccionó ningún negocio jurídico



6


6. Informe cuántas demandas a la fecha existen en contra de la entidad y su estado actual, refiriendo a posibles indemnizaciones y/o costos económicos que deba asumir EMPITALITO E.S.P.



PROCESOS JUDICIALES

ÍTEM	CLASE	CANTID	RIESGO PROBABLE	
1	ORDINARIO LABORAL - 1ERA INSTANCIA INCLUYE ACUMULADOS	50	3	\$502.654.616
2	ORDINARIO LABORAL - 2DA INSTANCIA	15	10	\$991.487.005
3	LABORALES EN CONSULTA CON FALLO	1		0
4	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1		0
5	EJECUTIVOS	10	8	\$728.578.600
6	ADMINISTRATIVO NEIVA - 1RA INSTANCIA	16	1	Sin cuantía ya que busca la nulidad de acto administrativo
7	ADMINISTRATIVO NEIVA - 2DA INSTANCIA	5	1	Sin cuantía ya que busca la nulidad de acto administrativo
8	ACCIONES POPULARES (SE VINCULA A EMPITALITO E.S.P.)	7	0	
TOTAL		105	23	\$ 2.222.720.244,00

No. Procesos





7


7. En un cuadro, relaciones la planta actual de EMPITALITO E.S.P. destacando, tipo de contrato, objeto del contrato, valor del contrato, duración del mismo.



LA PLANTA EMPITALITO

No.	Tipo de vinculación	No. de trabajadores
1	Empleados públicos	9
2	Trabajadores Contrato a término indefinido	66
3	Trabajadores con contrato a término fijo	6
Total		81

No. Trabajadores





CONTRATO A TÉRMINO FIJO

No.	Tipo de vinculación	Objeto del contrato / cargo	Valor/ Salario	Duración	
				Fecha Inicial	Fecha Terminación
1	Contrato a término fijo	Apoyo operativo de fontanería en el área comercial y demás requeridas en EMPITALITO E.S. P	\$ 2.000.000	3/02/2026	30/12/2026
2		Apoyo operativo de fontanería en el área comercial y demás requeridas en EMPITALITO E.S. P	\$ 1.900.000	30/02/2026	30/12/2026
3		Apoyo operativo de fontanería en el área comercial y demás requeridas en EMPITALITO E.S. P	\$ 2.000.000	28/07/2026	30/12/2026
4		Apoyo y acompañamiento jurídico en los asuntos propios y de competencia de la oficina asesora jurídica de EMPITALITO E.S.P, asesoría jurídica y apoyo cuando sea requerido a las diferentes áreas de la empresa garantizando la legalidad de las actuaciones administrativas, la continuidad del servicio y el adecuado cumplimiento de las funciones institucionales.	\$ 2.750.000	9/07/2026	30/12/2026
5		Auxiliar de Laboratorio	\$ 1.900.000	22/07/2026	30/12/2026
6		Apoyo operativo de fontanería en el área comercial y demás requeridas en EMPITALITO E.S.P	\$ 1.900.000	5/08/2026	30/12/2026



8

8. Refiera si existe estudio alguno para trasladar el punto de captación de agua que surte el acueducto para los Laboyanos, de ser positiva la respuesta, adjuntar evidencias.

PUNTO DE CAPTACIÓN – SITUACIÓN ACTUAL Y PROYECCIÓN

● NO SE CONTEMPLA EL TRASLADO DEL PUNTO DE CAPTACIÓN



SUELOS
HIDRÁULICA
ESTRUCTURAL



ESTUDIOS DEL RESERVORIO



VIABILIDAD EN LA ZONA
ACTUAL

● TRASLADO DE CAPTACIÓN

- ✗ No existen estudios
- ✗ No existen diseños
- ✗ No hay proyectos formulados
- ✗ No se contempla actualmente

● FORTALECIMIENTO ACTUAL

- ✓ Sí existen estudios del PMAA
- ✓ Mejoramiento de infraestructura
- ✓ Obras previstas en la zona actual
- ✓ Optimización de la captación existente



9

9. ¿Se avecina, según las entidades encargadas de estudiar el clima, el fenómeno de El Niño? ¿EMPITALITO E.S.P. tiene previsto un plan de mitigación y/o de contingencia? De ser positiva la respuesta, adjuntar soportes.



Plan de Emergencia y Contingencia (PEC)

1. PEC ACTUALIZADO

- Febrero del 2026.
- Actualización del Plan de Emergencia y Contingencia (PEC), fortaleciendo las medidas de preparación, respuesta y continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado.

2. SOCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL

- Abril del 2026.
- El PEC actualizado fue socializado ante el comité de Gestión de Riesgo y Desastres, fortaleciendo la articulación y conocimiento institucional.

3. ANEXO TÉCNICO – FENOMENO DEL NIÑO

Complementa el PEC con medidas de:

- *Uso eficiente y ahorro del agua
- *Continuidad del servicio.
- *Preparación ante condiciones climáticas adversas.
- *Identificación y manejo de escenarios de riesgo.
- *Acciones operativas de mitigación y respuesta.
- *Seguimiento y comunicación de alertas.

El Anexo Técnico – Fenómeno del Niño complementa y fortalece el Plan de Emergencia y Contingencia, orientando las acciones Institucionales de prevención, mitigación, preparación y respuesta ante posibles escenarios de desabastecimiento y afectaciones asociadas a este fenómeno climático.



10

10. La pregunta anterior supone que a futuro se deba preservar las reservas ambientales y garantizar la protección de las cuencas de los ríos que nos surten el líquido vital. Por lo anterior informe qué acciones e inversiones ha generado EMPITALITO E.S.P. para proteger los Ríos Guachicos y Guarapas como principales abastecedores de agua.

ACCIONES PARA PROTEGER LOS RÍOS GUACHICOS Y GUARAPAS COMO PRINCIPALES ABASTECEDORES DE AGUA.

Protección y conservación de las zonas de manejo especial



- Limpieza y recolección de residuos contaminantes aguas arriba de la bocatoma
- Reforestación con especies nativas en predios ubicados aguas arriba del río Guachicos
- Capacitación a los habitantes del área rural sobre la importancia de la protección y conservación
- Adquisición de predios estratégicos para la protección y conservación de la fuente hídrica

Mantenimiento y optimización de la infraestructura de captación y conducción.



- Mantenimiento y limpieza de los macromedidores de agua cruda
- Mantenimiento y limpieza del canal de derivación de la bocatoma
- Limpieza de las rejillas de fondo y laterales de la bocatoma
- Inspección de los tanques de almacenamiento para detectar fugas o daños.
- Mantenimiento y limpieza de los desarenadores.

ACCIONES PARA PROTEGER LOS RÍOS GUACHICOS Y GUARAPAS COMO PRINCIPALES ABASTECEDORES DE AGUA.

Uso eficiente y ahorro del agua



- Capacitaciones sobre aprovechamiento de aguas lluvias
- Promoción de buenas prácticas para disminuir el consumo de agua
- Entrega de material educativo y folletos sobre el buen uso del agua.
- Campañas de sensibilización dirigidas a usuarios, comunidades e instituciones educativas

Campañas de educación y cultura del agua.



- Actividades con usuarios e instituciones educativas.
- Divulgaciones a través de redes sociales, medios de comunicación
- Entrega de folletos y material educativo.
- Sensibilización sobre detección y reparación de fugas Capacitación a comunidades protección de las microcuencas.



ACCIONES PARA PROTEGER LOS RÍOS GUACHICOS Y GUARAPAS COMO PRINCIPALES ABASTECEDORES DE AGUA.

Convenio Interadministrativo No. 023 de 2024, suscrito entre el Municipio de Pitalito y EMPITALITO E.S.P., cuyo objeto correspondió a “AUNAR ESFUERZOS PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA EL CEDRO, PERTENECIENTE A LA CUENCA DEL RÍO GUACHICOS, EN EL CORREGIMIENTO DE BRUSELAS





ACCIONES PARA PROTEGER LOS RÍOS GUACHICOS Y GUARAPAS COMO PRINCIPALES ABASTECEDORES DE AGUA.



Identificación, medición y reducción de pérdidas de agua.

Índice de Pérdidas por Usuario Facturado – IPUF

AÑO	# VISITAS	# EFECTIVAS A FRAUDE	VALOR FACTURADO IPUF
2024	1262	210	\$ 65.156.834
2025	960	341	\$ 105.568.841
2026	316	100	\$74,038,163
TOTAL			\$244.763.838



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Índice de Pérdidas por Usuario Facturado – IPUF.

emp
Empitalito





11

11. El centro de Pitalito cuenta con un alcantarillado obsoleto en donde se evidencia su fin de vida útil. ¿EMPITALITO E.S.P. tiene contemplado la reposición del alcantarillado en este sector?

ALCANTARILLADO SECTOR CENTRO – DIAGNÓSTICO Y PLAN DE INTERVENCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

- Redes antiguas
- Sistema combinado sanitario +lluvias

NECESIDAD

- Modernizar infraestructura
- Reducir sobrecargas

SOLUCIÓN

- Proyecto macro
- Reponer redes
Separar sanitario/pluvial

El sistema actualmente funciona, pero requiere modernización progresiva para mejorar su capacidad y reducir sobrecargas.



12

12. Mediante Acuerdo Municipal 042 de 2020 se ajustó el POT para incorporar suelos rurales, suburbano y de expansión urbana al perímetro urbano de la ciudad, Acuerdo que generó un proceso judicial entre otros por la disposición de servicios públicos. EMPITALITO E.S.P. a la fecha actual, puede certificar que garantiza la prestación del servicio público de alcantarillado y acueducto a estos predios incorporados.

REDIOS INCORPORADOS AL PERÍMETRO URBANO – DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS



PREDIOS
Acuerdo 042
de 2020



EVALUACIÓN TÉCNICA

- Capacidad disponible
- Infraestructura
- Puntos de conexión
- Avance Fase II



- 💧 DISPONIBILIDAD
- ☑ Se puede otorgar
- ⚠ Se puede condicionar
- ✗ Se puede limitar

Estar dentro del perímetro urbano NO significa tener disponibilidad automática de acueducto y alcantarillado.



13

13. Las demás que producto del informe y/o del debate, surjan.”



RESULTADOS FAVORABLES

Resultados de Desempeño Institucional	2024	2025
Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)	60.4	90
Indicador Único Sectorial (IUS),	79.20	83.52
Informe de Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados Abreviada		96.43



Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

emp
Empitalito

GRACIAS

**¡El Gobierno
De la Gente!**

www.empitalito.gov.co



alcaldiapitalito.gov.co
